

パイプライン運転停止報告

令和8年7月29日 T M E S 株式会社


【 概 要 】

1. 運転停止期間
芦屋浜地区東・西(#0100系統・#0600系統以外)
6月27日(土)~未定
2. 運転停止原因
浸入水による影響
3. 作業内容
6/27 (土) #0400遮断弁水位異常発生
#1100系統・#1200系統圧力過昇により運転出来ず
浸入水排水作業実施
手動運転にて収集運転実施するも解消されず

6/28 (日) #0400遮断弁水位異常発生
排水ポンプによる浸入水排水作業実施

6/29 (月)~現在
#0100系統・#0600系統・南芦屋浜地区の
収集運転実施
その他の系統は浸入水の影響により収集運転停止
水抜き作業後、一部投入口運転等実施(試運転)
4. 対応等
該当の投入口へ貼り紙(臨時収集のお知らせ)
ネット・コーン設置(6/29 月曜日)

#0400遮断弁 点検口内

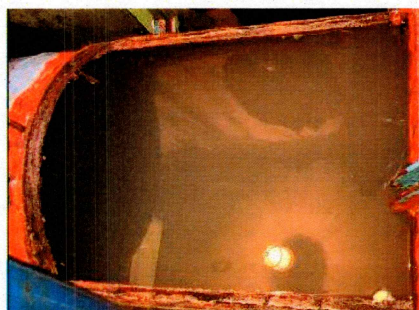

遮断弁



6/29 (月) ・#0100系統・#0600系統収集運転実施、水を吸引しておりますが収集運転は行えております。
(但し、センター内 切替機、専用溝にて水抜き必要、又センター設備 貯留ドラムスクリュウ
ブリッジ発生の可能性あり)

上記以外の芦屋浜地区投入口収集運転できず

原因：Ⅰ系幹線のⅠ-4点検口、Ⅱ系幹線のⅡ-2'点検口付近の浸入水

浸入水排水を実施するも再度溜まる状態(輸送管内水幅300mm以上の水あり)

芦屋浜地区#0100系統・#0600系統以外の投入口に臨時収集用ネット、コーン設置及び
お知らせビラ貼付実施

6/30 (火) ・排水作業継続
輸送管内浸入水確認、排水作業実施(輸送管内水幅300mm以上の水あり)
ネット追加：#09019、#09029、#11129、#11139、#11149投入口 (各1枚)

7/1 (水) ・排水作業継続
排水作業実施後、手動運転にて#0500系統収集運転実施
収集することは出来ましたが、大量の水を吸引(吸引後輸送管内水幅200mm以上の水あり)
#03052投入口のネット・コーン撤去し、#03051投入口へ統合(芦屋市様からのご依頼)

7/2 (木) ・排水作業継続
排水作業実施後、手動運転にてⅡ系#0900、1100系統収集運転実施
大量の水を吸引(吸引後、輸送管内水幅200mm以上の水あり)
・#0700遮断弁水位異常発生 ピット内壁面及び床面クラックによる漏水あり
排水作業実施

7/3 (金) ・排水作業継続
・#0700遮断弁のピット内壁面及び床面クラック部分に止水セメント塗付け実施
完全には止水できず


7/4 (土) ・排水作業継続
・#0700遮断弁のピット内壁面及び床面クラックの状態確認、水流入あり
ピット内200mmの水あり、排水実施

- 7/14 (火) ・排水作業継続
・#0400遮断弁、輸送管内水幅300mmの水あり、排水実施
・#0300系統Kライン点検口輸送管内確認、水幅300mmの水あり 排水実施
- 7/15 (水) ・排水作業継続
・#0700遮断弁の輸送管内水幅250mmの水あり、排水実施
・#0500系統、#0900系統通気運転実施、大量の浸入水を収集したため
圧力上昇、通気運転停止
- 7/16 (木) ・排水作業継続
・#1100遮断弁の輸送管内確認、水幅150mmの水あり、排水実施
・I-G-1、I-G-2、I-G-3輸送管内確認、滞留水認められず
・#0300系統Gライン、#1100系統通気運転実施、大量の浸入水を収集したため
圧力上昇、通気運転停止

- 7/17 (金) ・排水作業継続
・#0700遮断弁の輸送管内水幅150mmの水あり、排水実施
・#0300系統Gライン、#0900系統通気運転実施、大量の浸入水を収集したため
圧力上昇、通気運転停止
・#0700系統通気運転実施、収集可能な吸込み圧力を確認
- 7/21 (火) ・排水作業継続
・#1100系統下流側点検口輸送管内確認、水幅450mmの水あり、排水実施
・#0700系統、#1100系統下流側通気運転実施、収集可能な吸込圧力を確認
- 7/22 (水) ・排水作業継続
・#0900遮断弁の輸送管内水幅300mmの水あり、排水実施
・#1100系統下流側の通気運転実施、収集可能な吸込圧力を確認
- 7/23 (木) ・排水作業継続
・#0900遮断弁の輸送管内水幅300mmの水あり、排水実施
・#1100系統上流側の通気運転実施、圧力上昇により通気運転停止



切替機輸送管内排水作業 (2026/7/9)

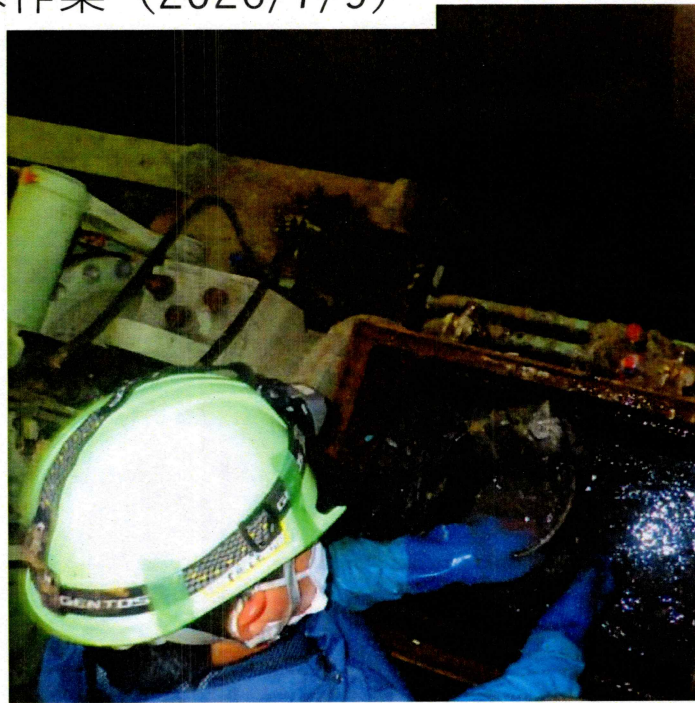



#0400



#1200

遮断弁



II - G - 3



II - G - 3 輸送管内

#1100系統下流側点検口
